Bauleistungen AG

Gemeinde Zell, Ortsteil Kollbrunn
Dorf- / Bolsternstrasse
Bauprogramm

Mon 15.01.18
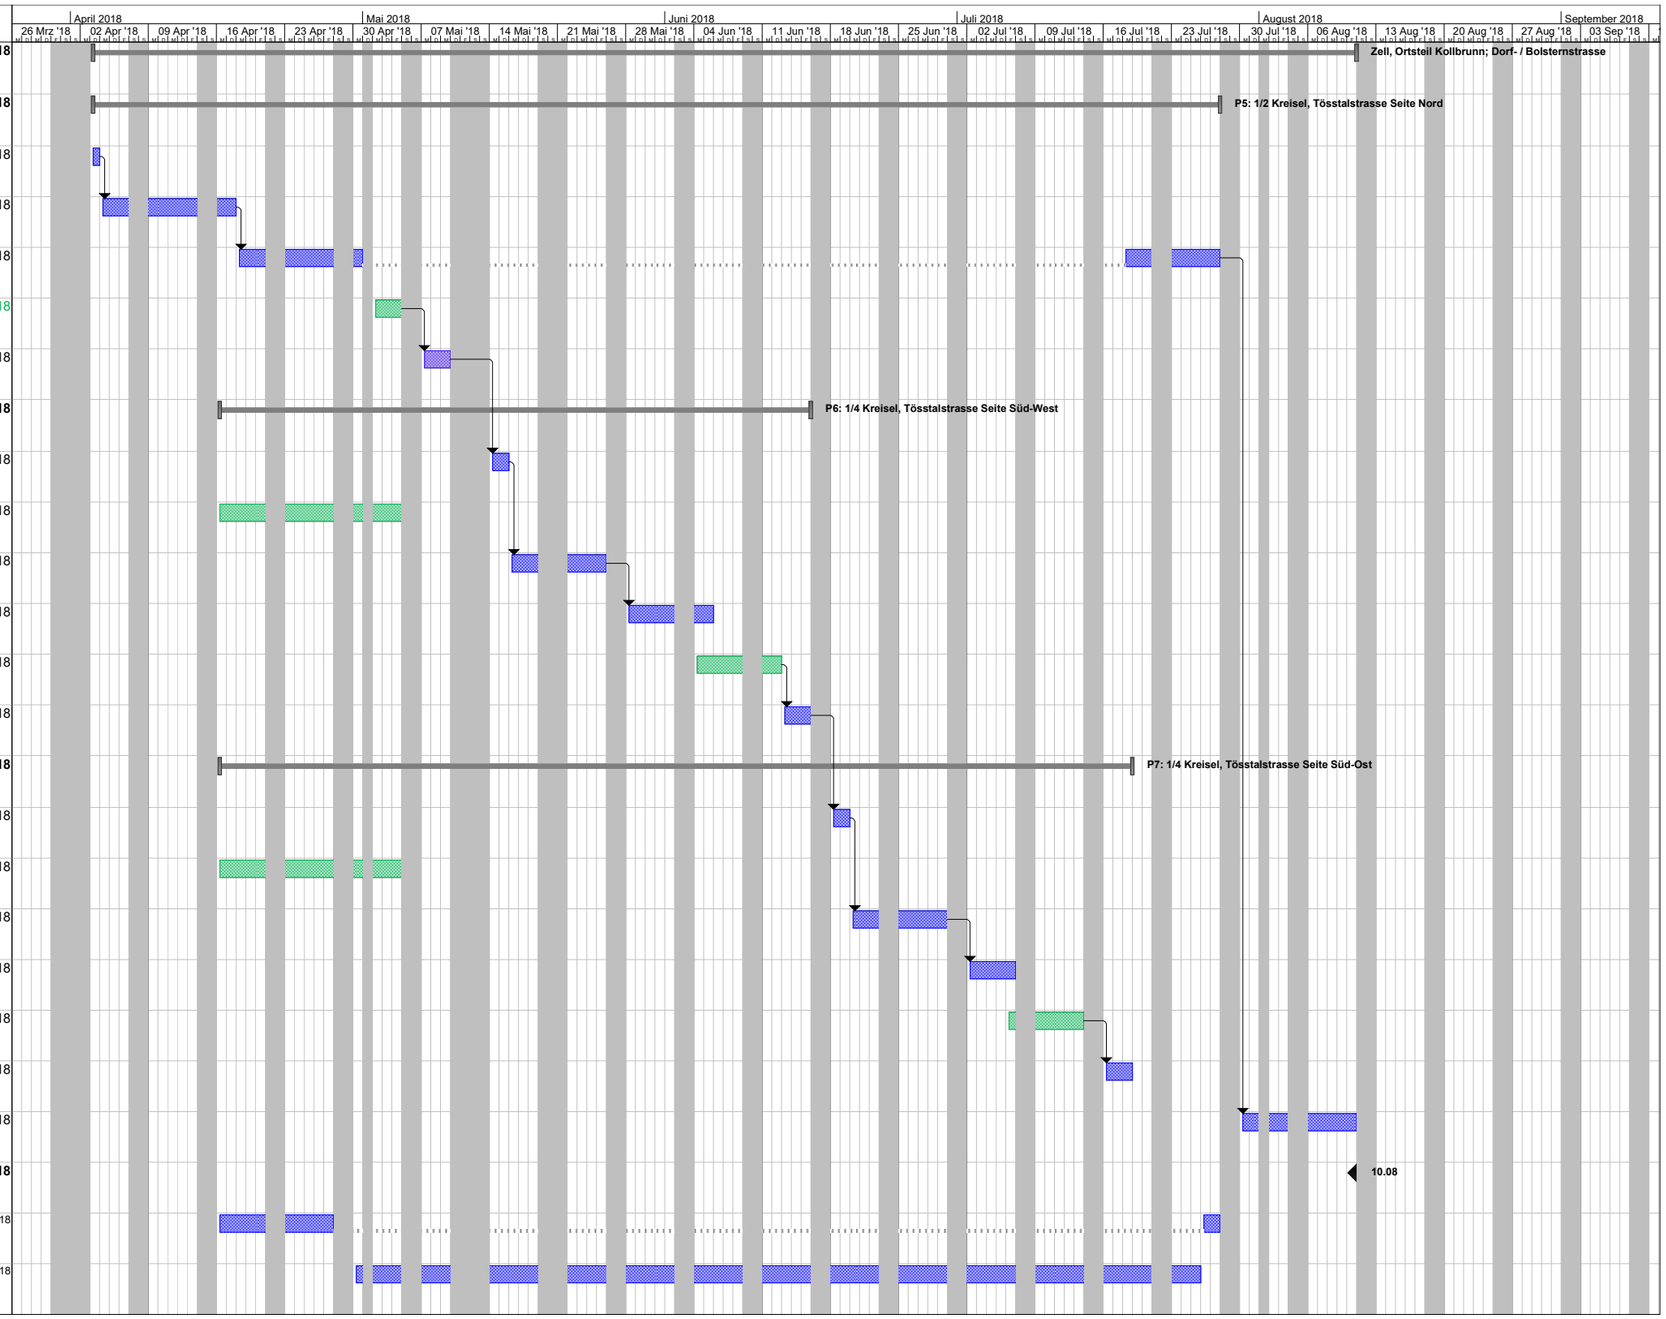
Nr.	Tätigkeit	Dauer	Anfang	Ende
1	**Zell, Ortsteil Kollbrunn; Dorf- / Bolsternstrasse**	**89 t**	**Die 03.04.18**	**Fre 10.08.18**
2	**P5: 1/2 Kreisel, Tösstalstrasse Seite Nord**	**80 t**	**Die 03.04.18**	**Fre 27.07.18**
3	Belag und Randabschlüsse abbrechen	1 t	Die 03.04.18	Die 03.04.18
4	Entwässerung + Werkleitungen	10 t	Mit 04.04.18	Die 17.04.18
5	Strassenbau	69 t	Mit 18.04.18	Fre 27.07.18
6	Betonarbeiten Kreisel	3 t	Mit 02.05.18	Fre 04.05.18
7	Beläge und prov. Anpassungen	3 t	Mon 07.05.18	Mit 09.05.18
8	**P6: 1/4 Kreisel, Tösstalstrasse Seite Süd-West**	**41 t**	**Mon 16.04.18**	**Fre 15.06.18**
9	Belag und Randabschlüsse abbrechen	2 t	Mon 14.05.18	Die 15.05.18
10	Instandsetzung / Anpassung Brücke über Fabrikkanal	14 t	Mon 16.04.18	Fre 04.05.18
11	Entwässerung + Werkleitungen	7 t	Mit 16.05.18	Fre 25.05.18
12	Strassenbau	7 t	Mon 28.05.18	Die 05.06.18
13	Betonarbeiten Kreisel und Fabrikkanal	7 t	Mon 04.06.18	Die 12.06.18
14	Beläge	3 t	Mit 13.06.18	Fre 15.06.18
15	**P7: 1/4 Kreisel, Tösstalstrasse Seite Süd-Ost**	**64 t**	**Mon 16.04.18**	**Mit 18.07.18**
16	Belag und Randabschlüsse abbrechen	2 t	Mon 18.06.18	Die 19.06.18
17	Instandsetzung / Anpassung Brücke über Fabrikkanal	14 t	Mon 16.04.18	Fre 04.05.18
18	Entwässerung + Werkleitungen	8 t	Mit 20.06.18	Fre 29.06.18
19	Strassenbau	5 t	Mon 02.07.18	Fre 06.07.18
20	Betonarbeiten Kreisel und Fabrikkanal	6 t	Fre 06.07.18	Fre 13.07.18
21	Beläge	3 t	Mon 16.07.18	Mit 18.07.18
22	Deckbelagsarbeiten und Fertigstellungen	9 t	Mon 30.07.18	Fre 10.08.18
23	**Bauende**	**0 t**	**Fre 10.08.18**	**Fre 10.08.18**
24	Kanal trocken	71 t	Mon 16.04.18	Fre 27.07.18
25	Kanal Durchlauf ca. 50%	59 t	Mon 30.04.18	Mit 25.07.18
